

# Umbau Kreisel



Karl-Heinz-Kipp-Straße




# Köbig Kreisel – Stadt Alzey



## Planung

61


Anschlussstelle Alzey

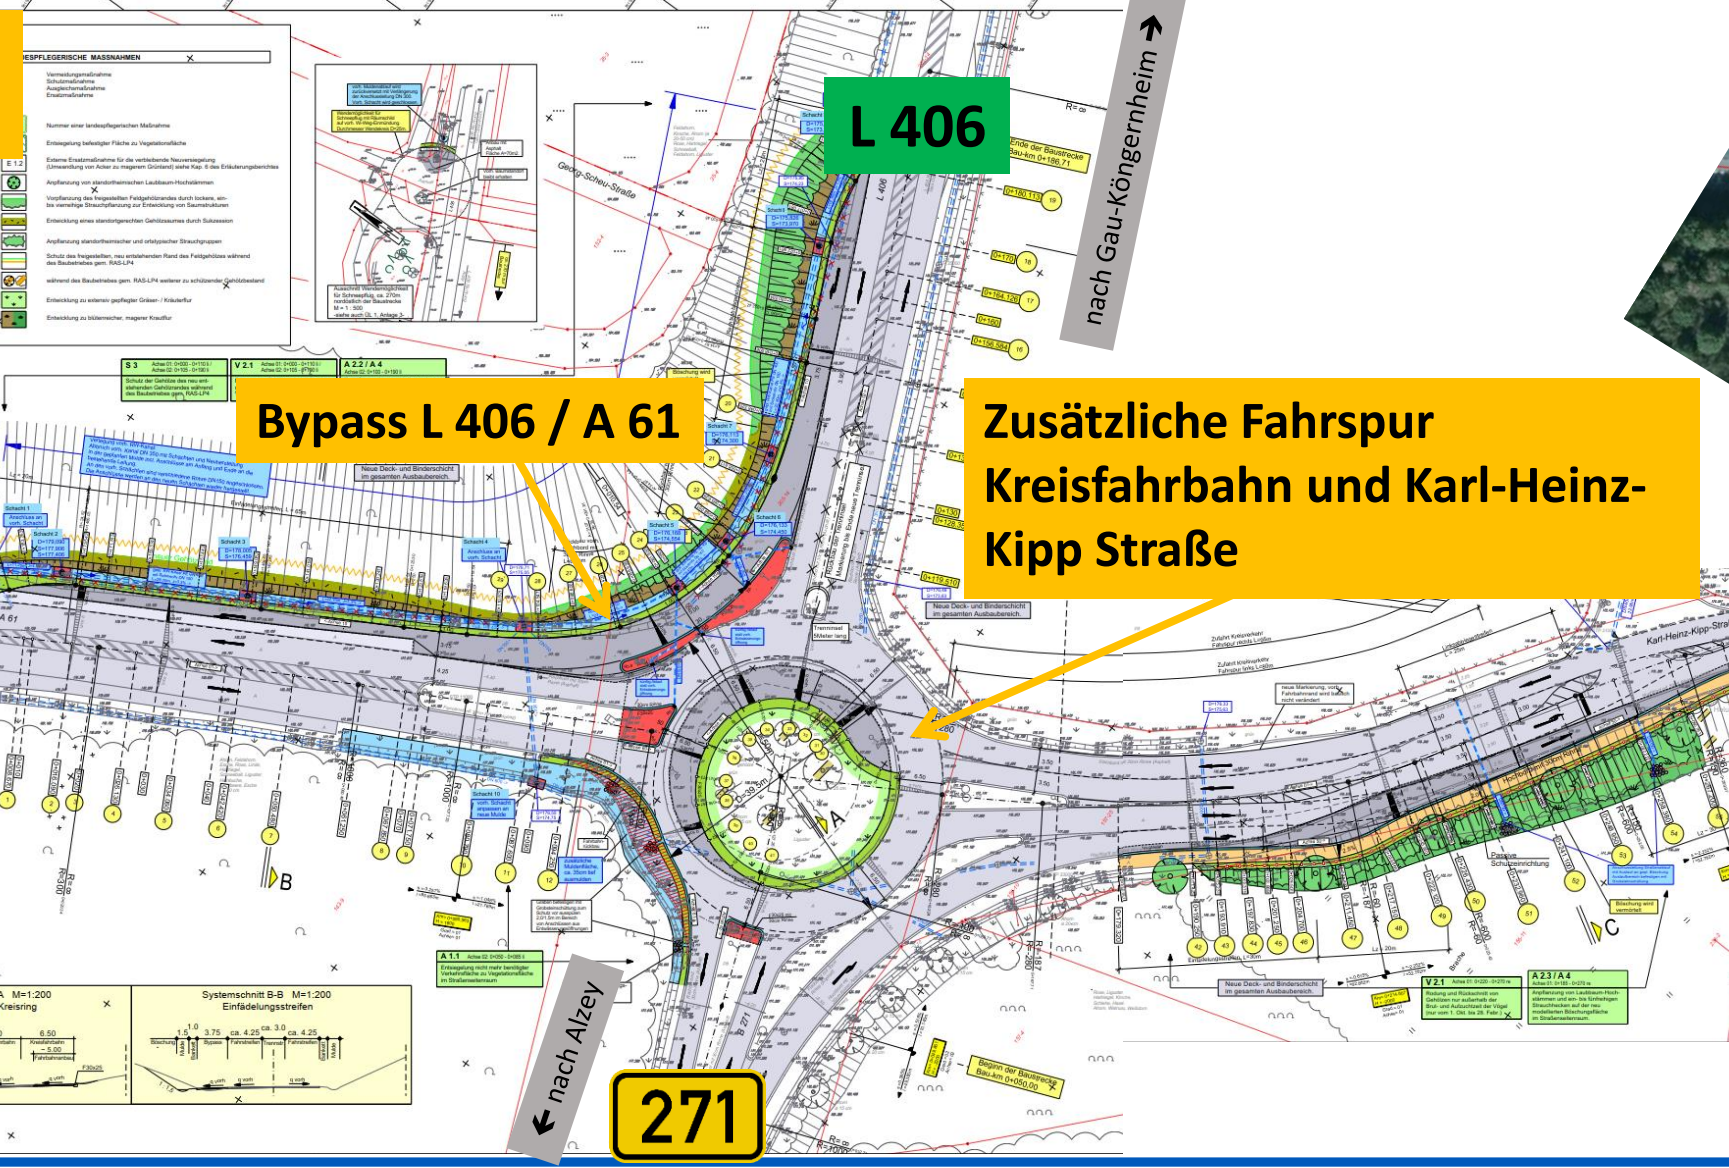

Bypass L 406 / A 61

Zusätzliche Fahrspur  
Kreisfahrbahn und Karl-Heinz-Kipp Straße

271



Karl-Heinz-Kipp-Straße

Baukosten  
692.000 Euro



**Stand 2022**



**Verkehrsbelastungen  
Spitzenstunde Kfz/h**



# Bauphase 1

Ziel: Samstag/Sonntag, 14./15. Januar 2023

Ziel: Samstag/Sonntag, 21./22. Januar 2023



- Rückbau der Verkehrsinseln
  - Ausbau der Karl-Heinz-Kipp-Straße/Robert-Bosch-Straße (im Auftrag der Stadt Alzey)
- 2 Wochenenden von Samstag 20 Uhr bis Montag 5 Uhr**  
**= 4 Tage Vollsperrung**

**Umleitung**  
gemäß  
Umleitungskonzept

Robert-Bosch-Straße

**Baufeld**




## Bauphase 2

Kreisel befahrbar!



Bauzeit Umbau 10 Wochen

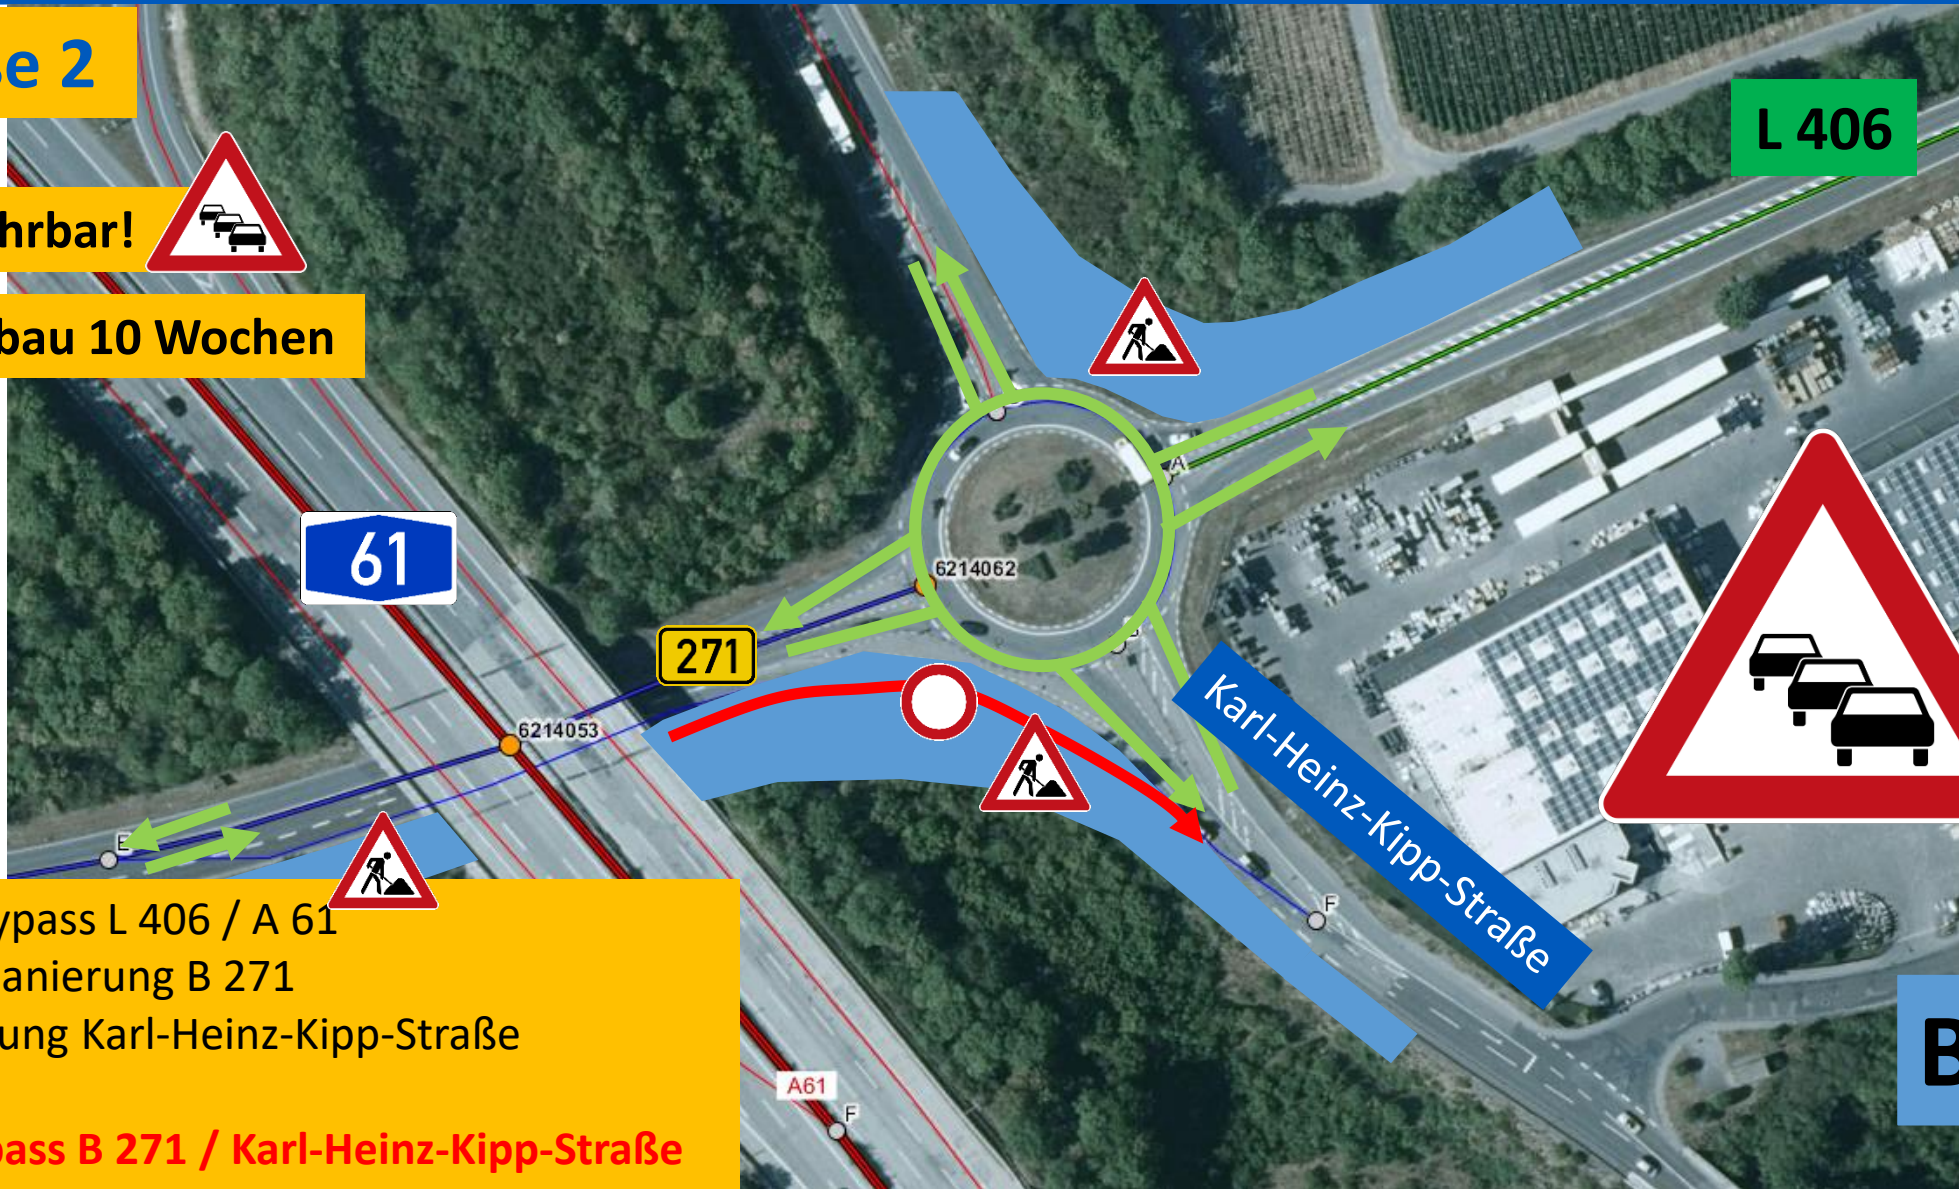

L 406

61

271

Karl-Heinz-Kipp-Straße



- Neubau Bypass L 406 / A 61
  - Fahrbahnsanierung B 271
  - Verbreiterung Karl-Heinz-Kipp-Straße
- Sperrung Bypass B 271 / Karl-Heinz-Kipp-Straße**

# Baufeld







## Bauphase 4

Kreisel befahrbar!



Bauzeit Umbau 10 Wochen



- Herstellung Innenkreisel

Sperrung Bypass B 271 / Karl-Heinz-Kipp-Straße

# Baufeld



## Bauphase 5

Kreisel befahrbar!



Bauzeit Umbau 10 Wochen



L 406

61

271

Karl-Heinz-Kipp-Straße

# Baufeld

• Rückbau Provisorium  
**Sperrung Bypass B 271 / Karl-Heinz-Kipp-Straße**



## Bauphase 6

Ziel: Osterferien: 03. April bis 08. April 2023

Ausweich: Pfingstferien: 30. Mai bis 07. Juni 2023




• Asphaltarbeiten sowie Herstellung der Inseln  
**Vollsperrung = 1 -2 Wochen; nur in den Schulferien**

**Umleitung**  
gemäß  
Umleitungskonzept

**Baufeld**



## Vollsperrung

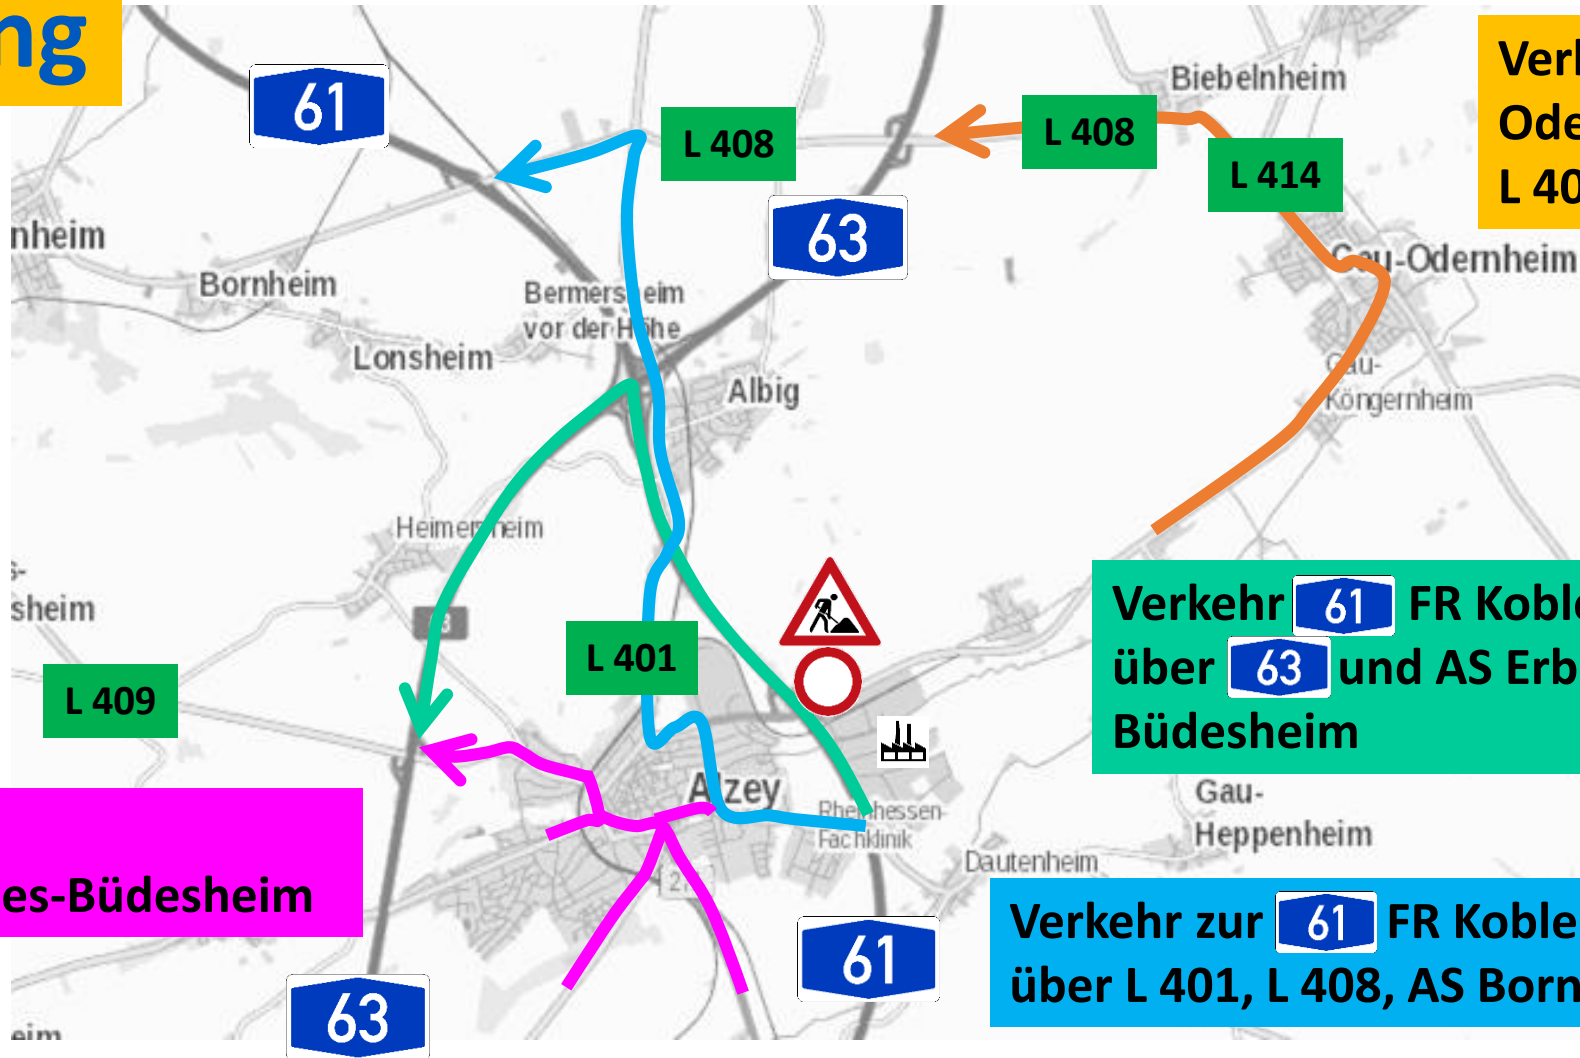

Verkehr aus Gau-Odernheim über L 414, L 408 auf **63**

Verkehr **61** FR Koblenz über **63** und AS Erbes-Büdesheim



Verkehr zur **63** über L 409 AS Erbes-Büdesheim

Verkehr zur **61** FR Koblenz über L 401, L 408, AS Bornheim

FR: Fahrtrichtung  
AS: Anschlussstelle




## Bauphase X

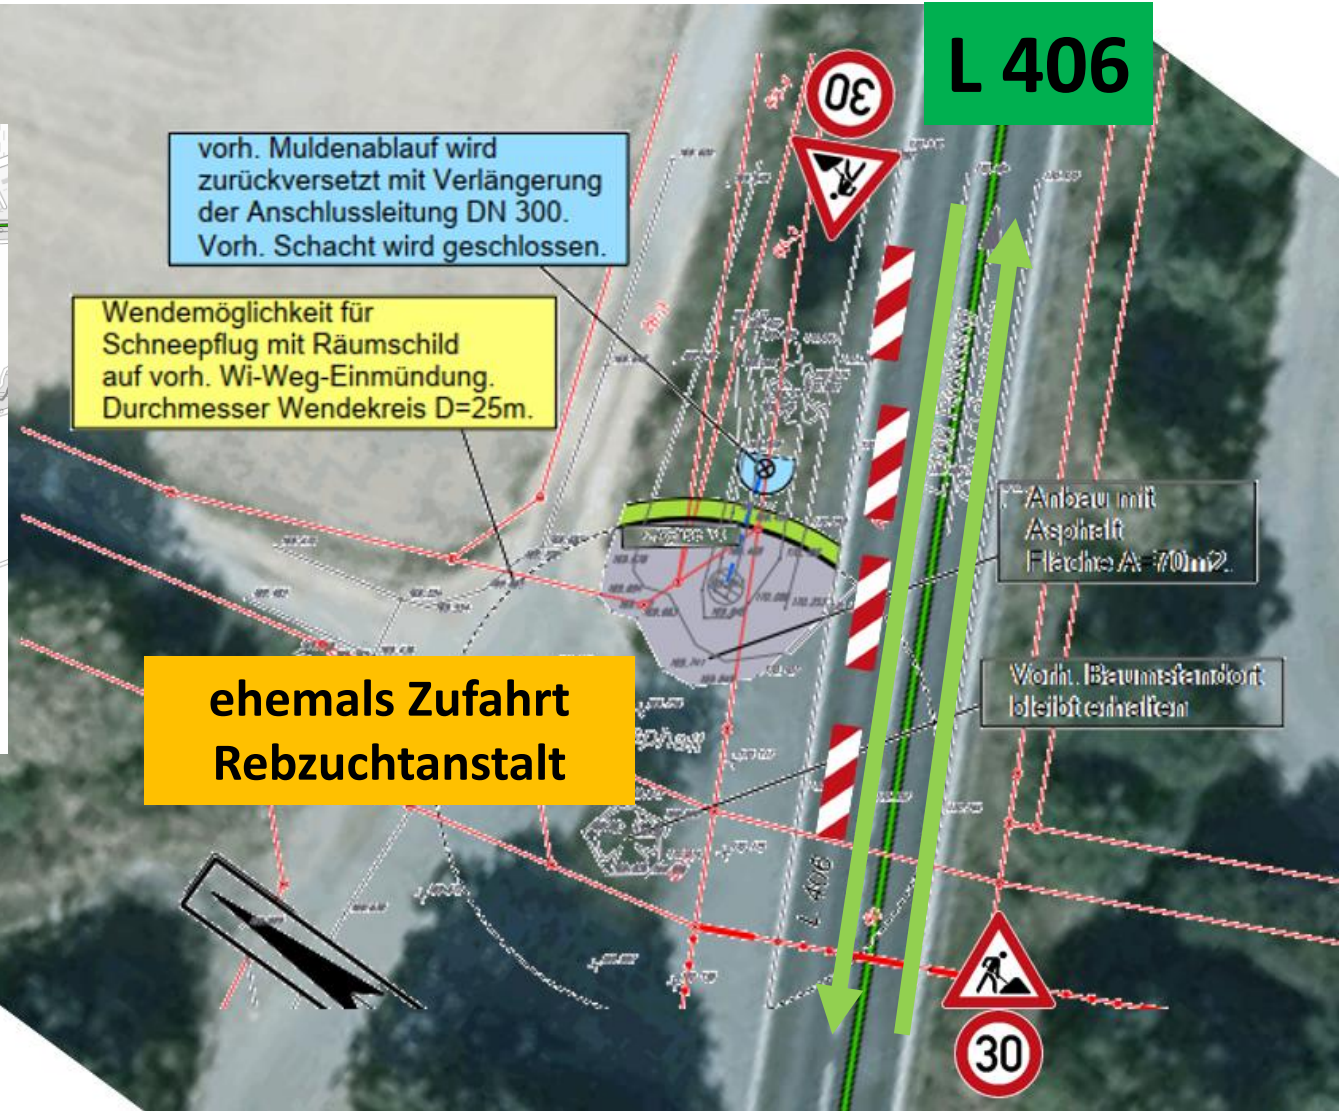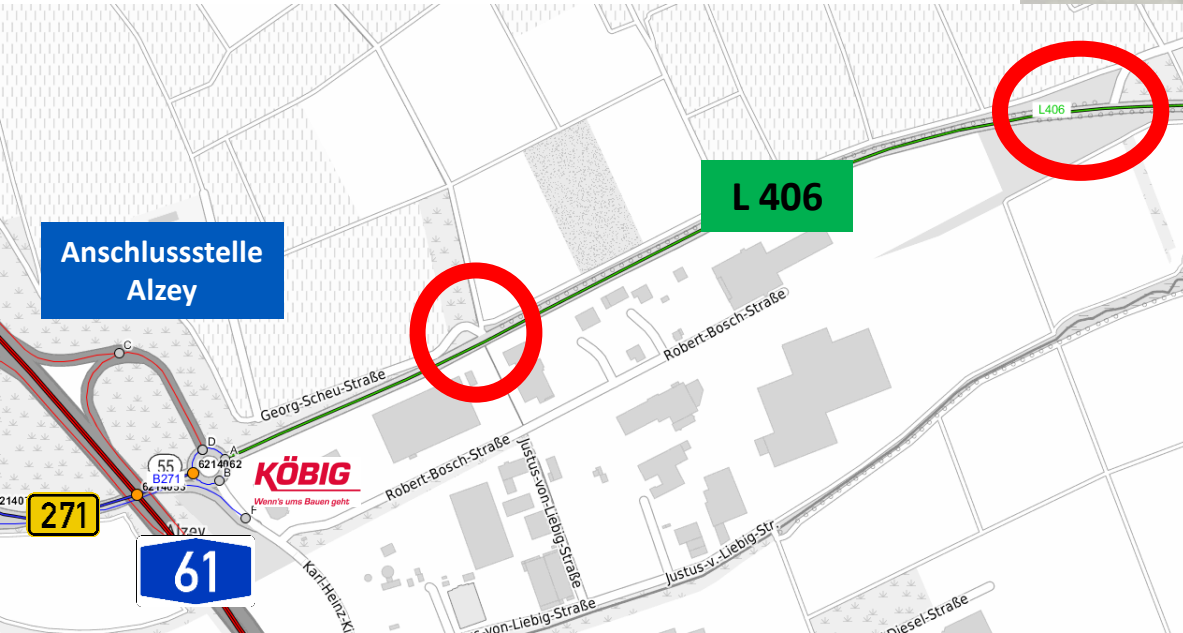

- Herstellung Betriebs-Wendehammer Winterdienst
- Fahrbahnsanierung L 406 im Bereich Alzey-Schaffhausen West



## Bauphase X

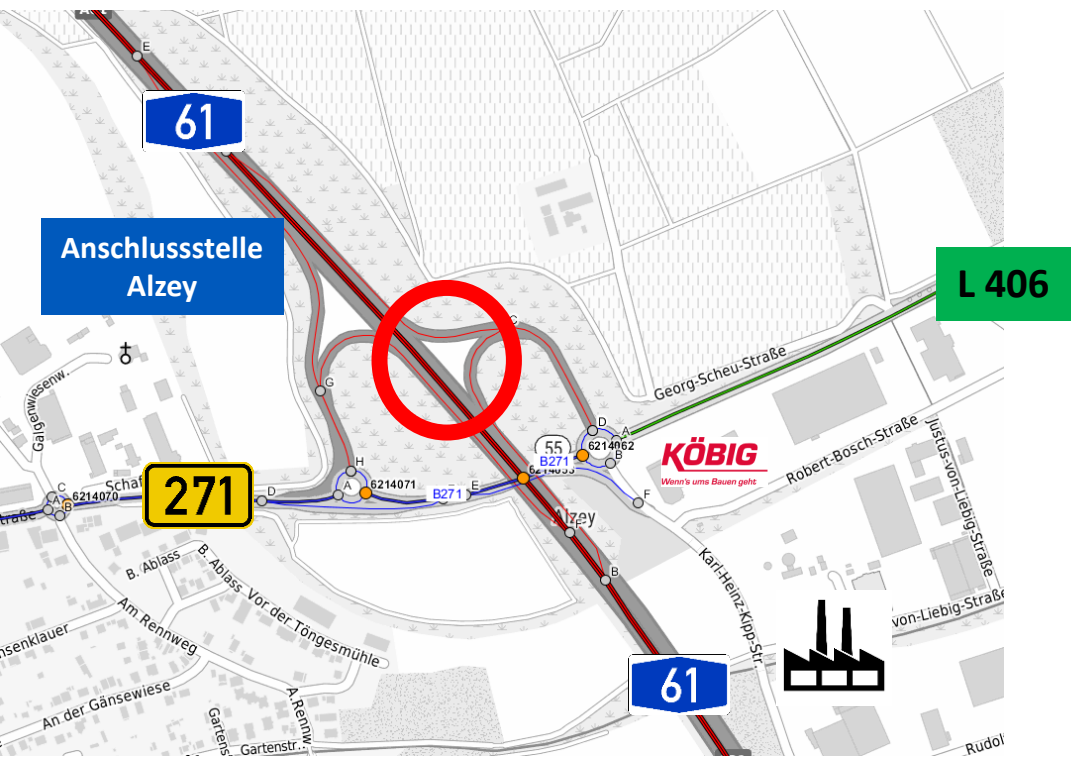

- Herstellung Betriebs-Wendehammer Winterdienst



**Baufeld**



## Zeitplan 2023

Bauzeit ca. 10 Wochen

Vollsperrung nur in den Ferien

Samstag 20 Uhr – Montag 5 Uhr

Samstag 20 Uhr – Montag 5 Uhr

Wochenendsperrungen im Januar 2023 sind wetterabhängig!



| Januar                   | Februar | März                        | April           | Mai                 | Juni  |
|--------------------------|---------|-----------------------------|-----------------|---------------------|-------|
| 1 So Neujahr             | 1 Mi    | 1 Mi                        | 1 Sa            | 1 Mo Tag der Arbeit | 1 Do  |
| 2 Mo                     | 2 Di    | 2 Do                        | 2 So            | 2 Di                | 2 Fr  |
| 3 Di                     | 3 Mi    | 3 Fr                        | 3 Mo            | 3 Mi                | 3 Sa  |
| 4 Mi                     | 4 Sa    | 4 Sa                        | 4 Do            | 4 Fr                | 4 So  |
| 5 Do                     | 5 So    | 5 So                        | 5 Mo            | 5 Fr                | 5 Mo  |
| 6 Fr Heilige Drei Könige | 6 Mo    | 6 Mo                        | 6 Do            | 6 Sa                | 6 Di  |
| 7 Sa                     | 7 Di    | 7 Di                        | 7 Fr Karfreitag | 7 So                | 7 Mi  |
| 8 So                     | 8 Mi    | 8 Mi                        | 8 Sa            | 8 Mo                | 8 Do  |
| 9 Mo                     | 9 Fr    | 9 Fr                        | 9 So            | 9 Di                | 9 Fr  |
| 10 Di                    | 10 Fr   | 10 Fr                       | 10 Mo           | 10 Mi               | 10 Sa |
| 11 Mi                    | 11 Sa   | 11 Sa                       | 11 Di           | 11 Do               | 11 So |
| 12 Do                    | 12 So   | 12 So                       | 12 Mi           | 12 Fr               | 12 Mo |
| 13 Fr                    | 13 Mo   | 13 Mo                       | 13 Do           | 13 Sa               | 13 Di |
| 14 Sa                    | 14 Di   | 14 Di                       | 14 Fr           | 14 So               | 14 Mi |
| 15 So                    | 15 Mi   | 15 Mi                       | 15 Sa           | 15 Mo               | 15 Do |
| 16 Mo                    | 16 Fr   | 16 Do                       | 16 So           | 16 Di               | 16 Fr |
| 17 Di                    | 17 Fr   | 17 Fr                       | 17 Mo           | 17 Mi               | 17 Sa |
| 18 Mi                    | 18 Sa   | 18 Sa                       | 18 Di           | 18 Do               | 18 So |
| 19 Do                    | 19 So   | 19 So                       | 19 Mi           | 19 Fr               | 19 Mo |
| 20 Fr                    | 20 Mo   | 20 Mo                       | 20 Do           | 20 Sa               | 20 Di |
| 21 Sa                    | 21 Di   | 21 Di                       | 21 Fr           | 21 So               | 21 Mi |
| 22 So                    | 22 Mi   | 22 Mi                       | 22 Sa           | 22 Mo               | 22 Do |
| 23 Mo                    | 23 Fr   | 23 Fr                       | 23 So           | 23 Di               | 23 Fr |
| 24 Di                    | 24 Fr   | 24 Fr                       | 24 Mo           | 24 Mi               | 24 Sa |
| 25 Mi                    | 25 Sa   | 25 Sa                       | 25 Di           | 25 Do               | 25 So |
| 26 Do                    | 26 So   | 26 So Beginn der Sommerzeit | 26 Mi           | 26 Fr               | 26 Mo |
| 27 Fr                    | 27 Mo   | 27 Mo                       | 27 Do           | 27 Sa               | 27 Di |
| 28 Sa                    | 28 Di   | 28 Di                       | 28 Fr           | 28 So               | 28 Mi |
| 29 So                    | 29 Mi   | 29 Mi                       | 29 Sa           | 29 Mo               | 29 Do |
| 30 Mo                    | 30 Fr   | 30 Do                       | 30 So           | 30 Di               | 30 Fr |
| 31 Di                    | 31 Fr   | 31 Fr                       |                 | 31 Mi               |       |

Wetterabhängig können die Arbeiten

- bis Ostermontag beendet werden.

Bei schlechter Witterung bei Nässe

- Verschiebung des Bauabschnitts um 7 Wochen in die Pfingstferien

**Osterferien:** 03. April bis 08. April 2023

**Pfingstferien:** 30. Mai bis 07. Juni 2023

Vollsperrung

Bauphasen 1-4



Kontakt: Landesbetrieb Mobilität Worms  
[lbm@lbm-worms.rlp.de](mailto:lbm@lbm-worms.rlp.de)



**Vielen Dank**

Foto LBM Worms: A 61/L 400 Umbau Anschlussstelle Gau Bickelheim 2018
